


水口社会福祉センター・水口保健センター・水口子育て支援センター 整備スケジュール

| 区分 | 年度 | 令和3年度 | | | | | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----------|----|----|---|---|---------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|---|---|--------------------|---|---|---------|---|---|---|----|----|---------|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----------|--|--|--|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 社会福祉センター | 設計 | 新センター改修設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事 | | | | | | Phase-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Phase-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引越し | | | | | | 仮事務所整備 (福祉ホール改修) | | | | | 新センター整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 福祉ホール解体 外構整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健センター | 設計 | | | | | | 新センター改築設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Phase-1 | | | Phase-2 | | | | | | Phase-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引越し | | | | | | | | | | | 仮事務所へ引越し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新センターへ引越し | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子育て支援センター | 設計 | | | | | | 新センター改築設計 | | | | | | | | | | | | 既存センター解体設計 (八坂) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 既存センター解体 (八坂) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引越し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新センターへ引越し | | | |

整備完了時配置図

令和7年4月～

予算決算常任委員会 資料
 令和3年(2021年)12月17日
 所管課名：健康福祉部福祉医療政策課
 すこやか支援課
 こども政策部子育て政策課

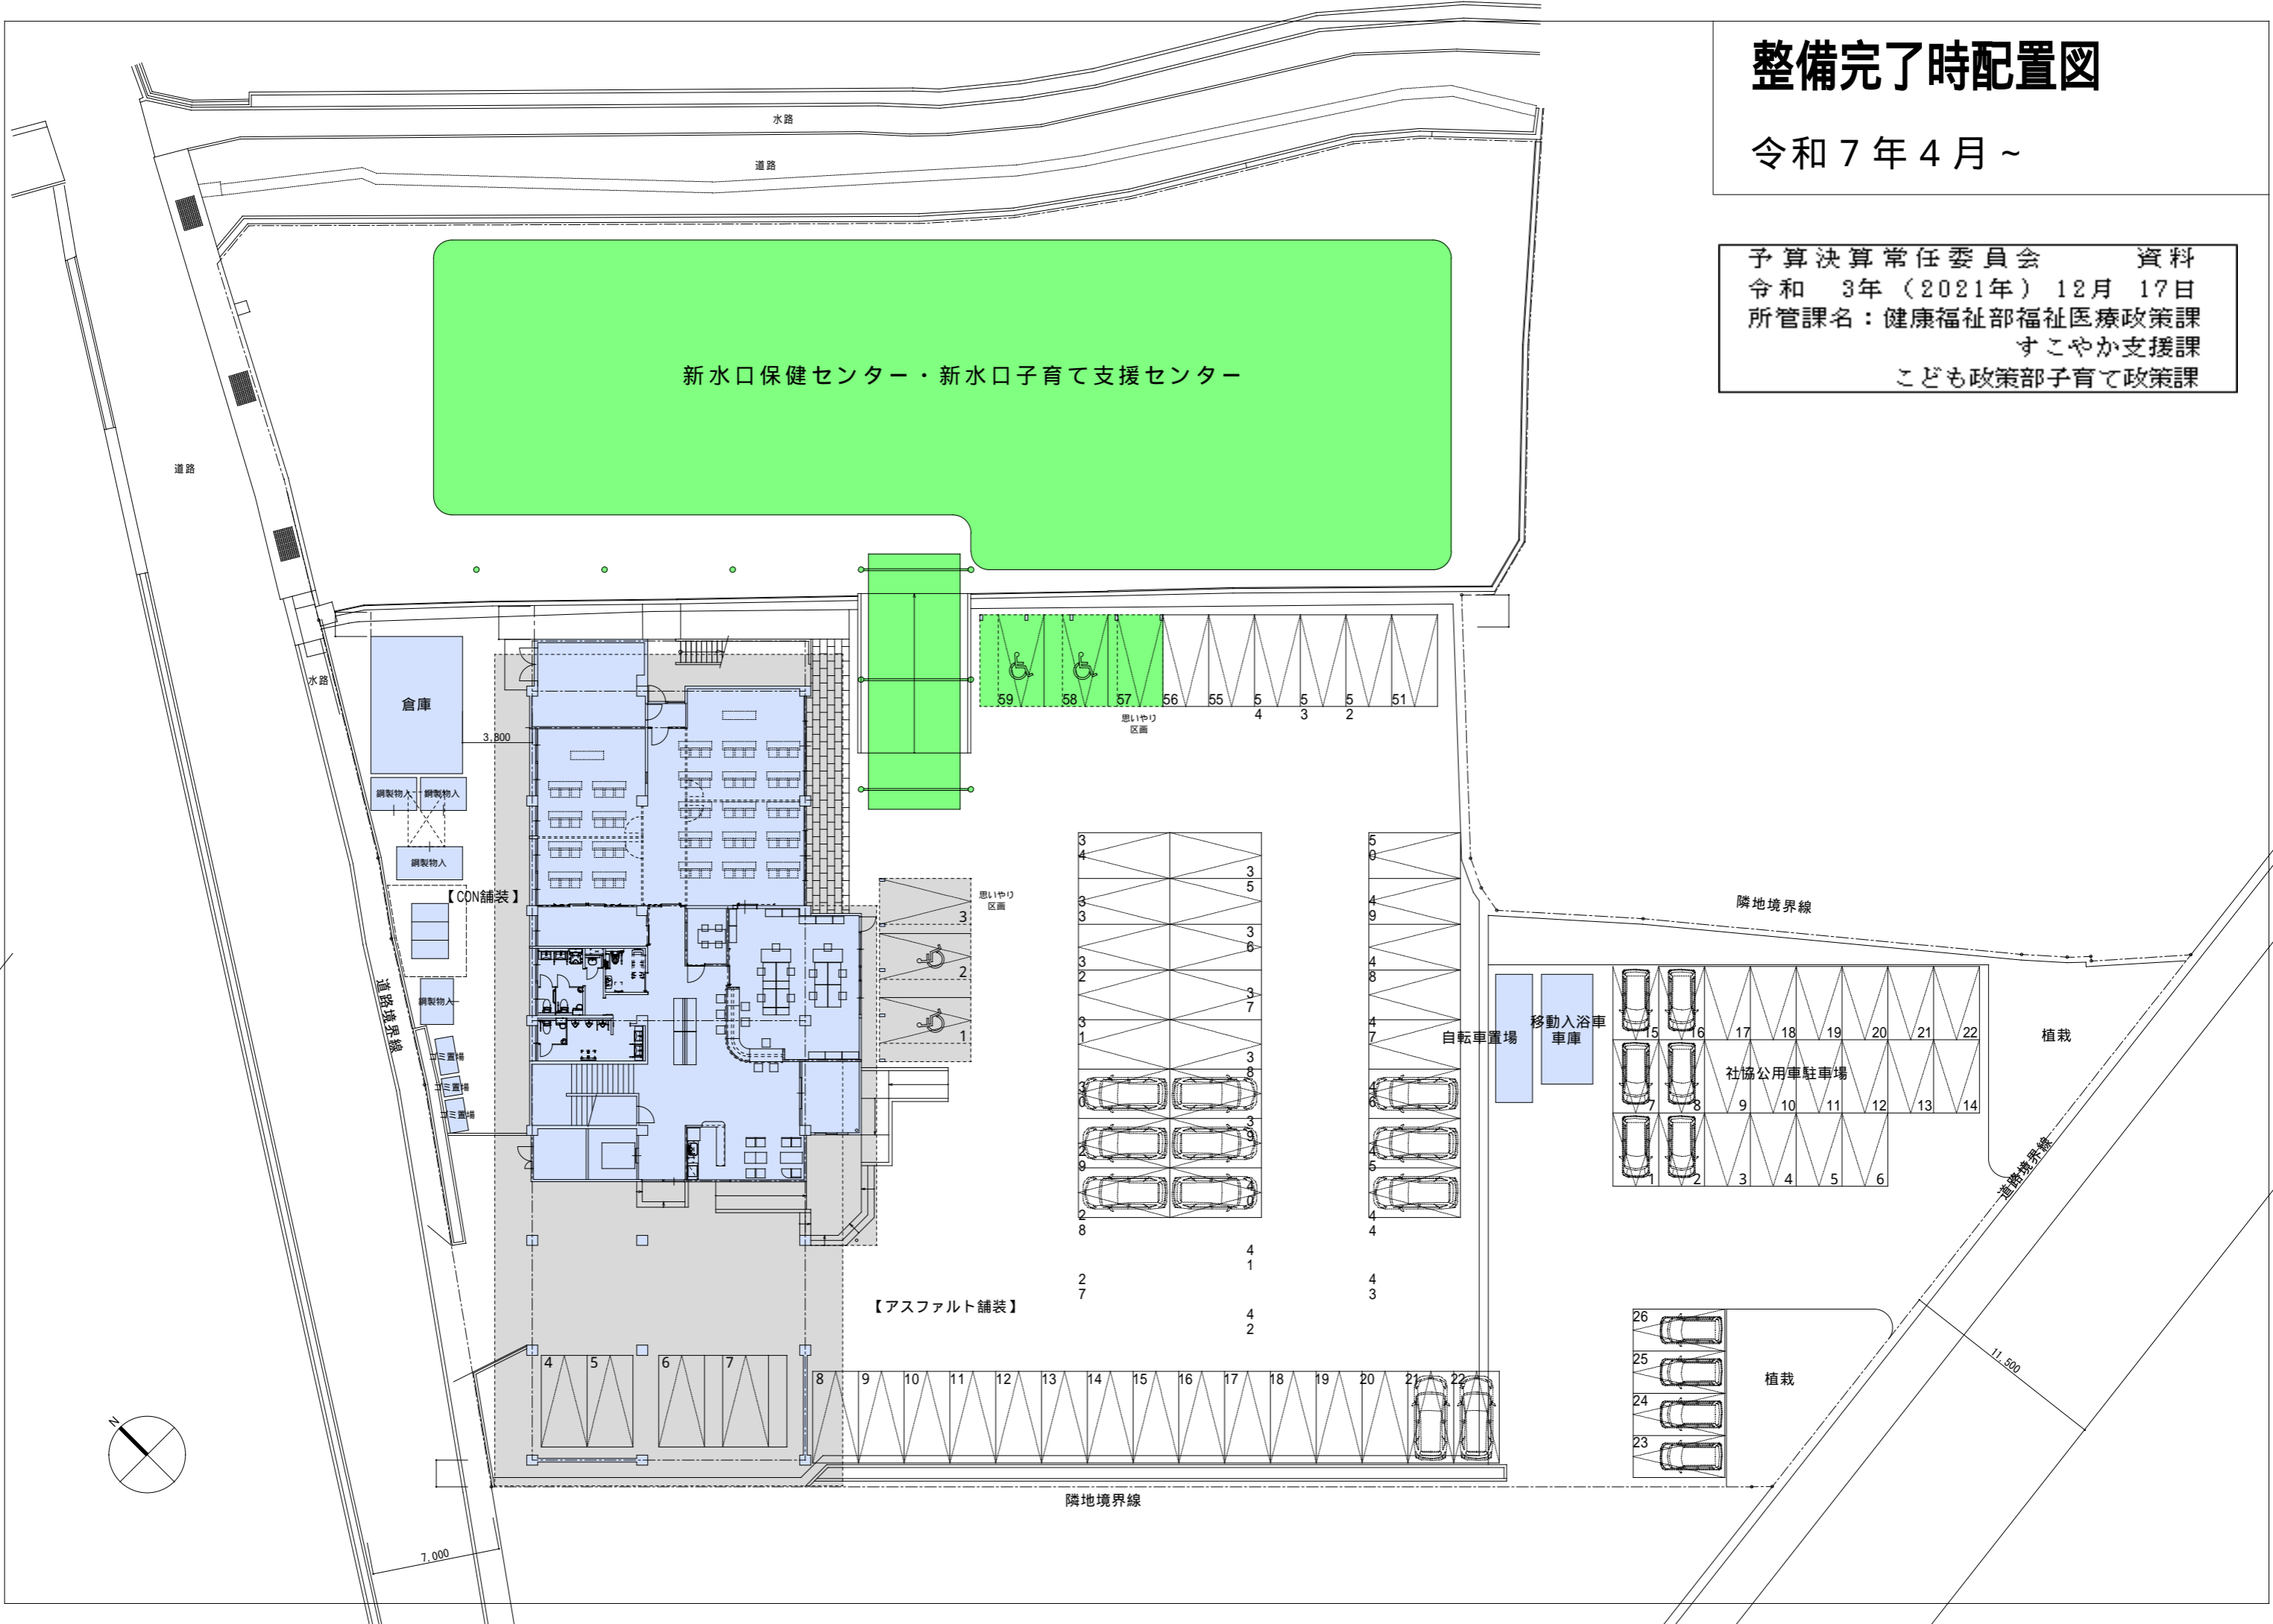

新水口保健センター・新水口子育て支援センター

倉庫

【CON舗装】

【アスファルト舗装】

59 58 57 56 55 54 53 52 51
 思いやり区画

思いやり区画

自転車置場

移動入浴車庫

隣地境界線

社協公用車駐車場

植栽

植栽

隣地境界線

11,500

7,000

3,800

